Bauzeitenplan

Flörsheim-Dalsheim / Ausbau der Ortsdurchfahrt; noch auszuführende Arbeiten; Stand 30.04.2014

April/Mai 2014 | Juni 2014 | Juli 2014 | August 2014 | September 2014

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Link Info
1	**Bauabschnitt 3 (St. 0+920 - 0+874)**	39at	Mi, 30.04.14	Fr, 27.06.14	
1.1	Verkehrssicherung ohne Weinbergstr. u Alzeyer Str,	1at	Mi, 30.04.14	Mi, 30.04.14	nach 1.2
1.2	Asphalt fräsen	1at	Fr, 02.05.14	Fr, 02.05.14	von 1.1 nach 1.3
1.3	Rinnenplatten ausbauen	1at	Mo, 05.05.14	Mo, 05.05.14	von 1.2
1.4	Brückenbau	32kt	Mo, 05.05.14	Do, 05.06.14	
1.4.1	restl. Plänungs- u. Genehmigungsphase	5kt	Mo, 05.05.14	Fr, 09.05.14	nach 1.4.2
1.4.2	Vorerkundung	5at	Do, 08.05.14	Mi, 14.05.14	von 1.4.1 nach 1.4.3
1.4.3	Erarbaiten einschl. Leistungssicherungen	2at	Mo, 12.05.14	Di, 13.05.14	von 1.4.2 nach 1.4.4
1.4.4	Teilabbruch Gewölbedurchlass u. Sohle	3at	Mi, 14.05.14	Fr, 16.05.14	von 1.4.3 nach 1.4.5
1.4.5	Bauwerk	8at	Mo, 19.05.14	Mi, 28.05.14	von 1.4.4 nach 1.4.6
1.4.6	Stützwand	9at	Di, 20.05.14	Mo, 02.06.14	von 1.4.5 nach 1.4.7
1.4.7	Rohrverlegung (2*DN 700 PE)	3at	Di, 03.06.14	Do, 05.06.14	von 1.4.6 nach 1.6
1.5	Verkehrssicherung erweitern (Weinbergstr. u. Alzeyer Str.)	1at	Fr, 06.06.14	Fr, 06.06.14	
1.6	Aushub Schotter / Boden	2at	Fr, 06.06.14	Di, 10.06.14	von 1.4.7 nach 1.7
1.7	Frostschutzschicht einbauen	1at	Mi, 11.06.14	Mi, 11.06.14	von 1.6 nach 1.8
1.8	Straßenabläufe anpassen	2at	Do, 12.06.14	Fr, 13.06.14	von 1.7 nach 1.9
1.9	Rinnenplatten setzen	3at	Mo, 16.06.14	Mi, 18.06.14	von 1.8 nach 1.10
1.10	Feinplanum herstellen	1at	Fr, 20.06.14	Fr, 20.06.14	von 1.9 nach 1.11
1.11	Straßeneinbauten anpassen	1at	Mo, 23.06.14	Mo, 23.06.14	von 1.10 nach 1.12
1.12	Asphalt einbauen	4at	Di, 24.06.14	Fr, 27.06.14	von 1.11
2	**Wasserleitung**	17at	Mi, 30.04.14	Fr, 23.05.14	
3	**Bauabschnitt 4 (St. 0+874 - 0+600)**	39at	Mi, 30.04.14	Fr, 27.06.14	
3.1	Umbau Verkehrssicherung	1at	Mi, 30.04.14	Mi, 30.04.14	nach 3.2
3.2	Asphalt fräsen	1at	Fr, 02.05.14	Fr, 02.05.14	von 3.1 nach 3.3
3.3	Rinnenplatten ausbauen	1at	Mo, 05.05.14	Mo, 05.05.14	von 3.2 nach 3.4
3.4	Hausanschlüsse erneuern	19at	Di, 06.05.14	Mo, 02.06.14	von 3.3 nach 3.5, 3.6
3.5	Aushub Schotter/Boden (bis -50 cm)	6at	Di, 03.06.14	Mi, 11.06.14	von 3.4
3.6	Frostschutzschicht einbauen	6at	Di, 03.06.14	Mi, 11.06.14	von 3.4 nach 3.7
3.7	Straßenabläufe anpassen	2at	Do, 12.06.14	Fr, 13.06.14	von 3.6 nach 3.8
3.8	Rinnenplatten setzen	3at	Mo, 16.06.14	Mi, 18.06.14	von 3.7 nach 3.9
3.9	Feinplanum herstellen	1at	Fr, 20.06.14	Fr, 20.06.14	von 3.8 nach 3.10
3.10	Straßeneinbauten anpassen	1at	Mo, 23.06.14	Mo, 23.06.14	von 3.9 nach 3.11
3.11	Asphalt einbauen	4at	Di, 24.06.14	Fr, 27.06.14	von 3.10
4	**Bauabschnitt 6 (St. 0+260 - 0+000 bzw. 5+200)**	28at	Mo, 19.05.14	Mo, 30.06.14	
4.1	Verkehrssicherung: LSA K36	1at	Mo, 19.05.14	Mo, 19.05.14	nach 4.2
4.2	Asphalt fräsen	2at	Di, 20.05.14	Mi, 21.05.14	von 4.1 nach 4.3
4.3	Rinnenplatten ausbauen	4at	Do, 22.05.14	Di, 27.05.14	von 4.2 nach 4.4
4.4	Hausanschlüsse erneuern	2at	Mi, 28.05.14	Fr, 30.05.14	von 4.3 nach 4.5, 4.6
4.5	Aushub Schotter/Boden (bis -50 cm)	5at	Mo, 02.06.14	Fr, 06.06.14	von 4.4
4.6	Frostschutzschicht einbauen	5at	Mo, 02.06.14	Fr, 06.06.14	von 4.4 nach 4.7
4.7	Straßenabläufe anpassen	3at	Di, 10.06.14	Do, 12.06.14	von 4.6 nach 4.8
4.8	Rinnenplatten setzen	6at	Fr, 13.06.14	Mo, 23.06.14	von 4.7 nach 4.9
4.9	Feinplanum herstellen	1at	Di, 24.06.14	Di, 24.06.14	von 4.8 nach 4.10
4.10	Straßeneinbauten anpassen	1at	Mi, 25.06.14	Mi, 25.06.14	von 4.9 nach 4.11
4.11	Asphalt einbauen	3at	Do, 26.06.14	Mo, 30.06.14	von 4.10 nach 5.1
5	**Bauabschnitt 7 (St. 5+200 - 5+000)**	19at	Di, 01.07.14	Fr, 25.07.14	
5.1	Verkehrssicherung: LSA K 36	1at	Di, 01.07.14	Di, 01.07.14	von 4.11 nach 5.2
5.2	Asphalt fräsen	2at	Mi, 02.07.14	Do, 03.07.14	von 5.1 nach 5.3
5.3	Rinnenplatten ausbauen	2at	Do, 03.07.14	Fr, 04.07.14	von 5.2 nach 5.6, 5.5, 5.4
5.4	Hausanschlüsse erneuerm	5at	Do, 03.07.14	Mi, 09.07.14	von 5.3
5.5	Querungen EWR	3at	Mo, 07.07.14	Mi, 09.07.14	von 5.3
5.6	Straßenabläufe anpassen	2at	Mo, 07.07.14	Di, 08.07.14	von 5.3 nach 5.7
5.7	Rinnenplatten setzen	4at	Mi, 09.07.14	Mo, 14.07.14	von 5.6 nach 5.8
5.8	Aushub Schotter/Boden (bis -50 cm)	4at	Mo, 14.07.14	Do, 17.07.14	von 5.7 nach 5.9
5.9	Frostschutzschicht einbauen	4at	Mo, 14.07.14	Do, 17.07.14	von 5.8 nach 5.10
5.10	Feinplanum herstellen	1at	Fr, 18.07.14	Fr, 18.07.14	von 5.9 nach 5.11
5.11	Straßeneinbauten anpassen	2at	Mo, 21.07.14	Di, 22.07.14	von 5.10 nach 5.12
5.12	Asphalt einbauen	3at	Mi, 23.07.14	Fr, 25.07.14	von 5.11
6	**Sommerferien**	30at	Mo, 28.07.14	Fr, 05.09.14	nach 7, 7.1
7	**Bauabschnitt 8 (St. 5+000 - 4+700)**	20at	Mo, 28.07.14	Fr, 22.08.14	von 6
7.1	Verkehrssicherung	1at	Mo, 28.07.14	Mo, 28.07.14	von 6 nach 7.2
7.2	Asphalt fräsen	1at	Di, 29.07.14	Di, 29.07.14	von 7.1 nach 7.3
7.3	Rinnenplatten ausbauen	1at	Mi, 30.07.14	Mi, 30.07.14	von 7.2 nach 7.4
7.4	Hausanschlüsse erneuern	5at	Do, 31.07.14	Mi, 06.08.14	von 7.3 nach 7.6, 7.7, 7.5
7.5	Querungen EWR	1at	Di, 05.08.14	Di, 05.08.14	von 7.4
7.6	Aushub Schotter/Boden (bis -50)	3at	Do, 07.08.14	Mo, 11.08.14	von 7.4
7.7	Frostschutzschicht einbauen	3at	Do, 07.08.14	Mo, 11.08.14	von 7.4 nach 7.8
7.8	Straßenabläufe anpassen	1at	Di, 12.08.14	Di, 12.08.14	von 7.7 nach 7.9
7.9	Rinnenplatten setzen	3at	Mi, 13.08.14	Fr, 15.08.14	von 7.8 nach 7.10
7.10	Straßeneinbauten anpassen	1at	Mo, 18.08.14	Mo, 18.08.14	von 7.9 nach 7.11
7.11	Feinplanum herstellen	1at	Di, 19.08.14	Di, 19.08.14	von 7.10 nach 7.12
7.12	Asphalt einbauen	3at	Mi, 20.08.14	Fr, 22.08.14	von 7.11 nach 8
8	**Verkehrsinseln**	10at	Mo, 25.08.14	Fr, 05.09.14	von 7.12 nach 9
9	**Markierung**	2at	Mo, 08.09.14	Di, 09.09.14	von 8 nach 10
10	**Baustellenräumung**	1at	Mi, 10.09.14	Mi, 10.09.14	von 9 nach 11
11	**Rückbau Umleitungsstrecke**	1at	Mi, 10.09.14	Mi, 10.09.14	von 10

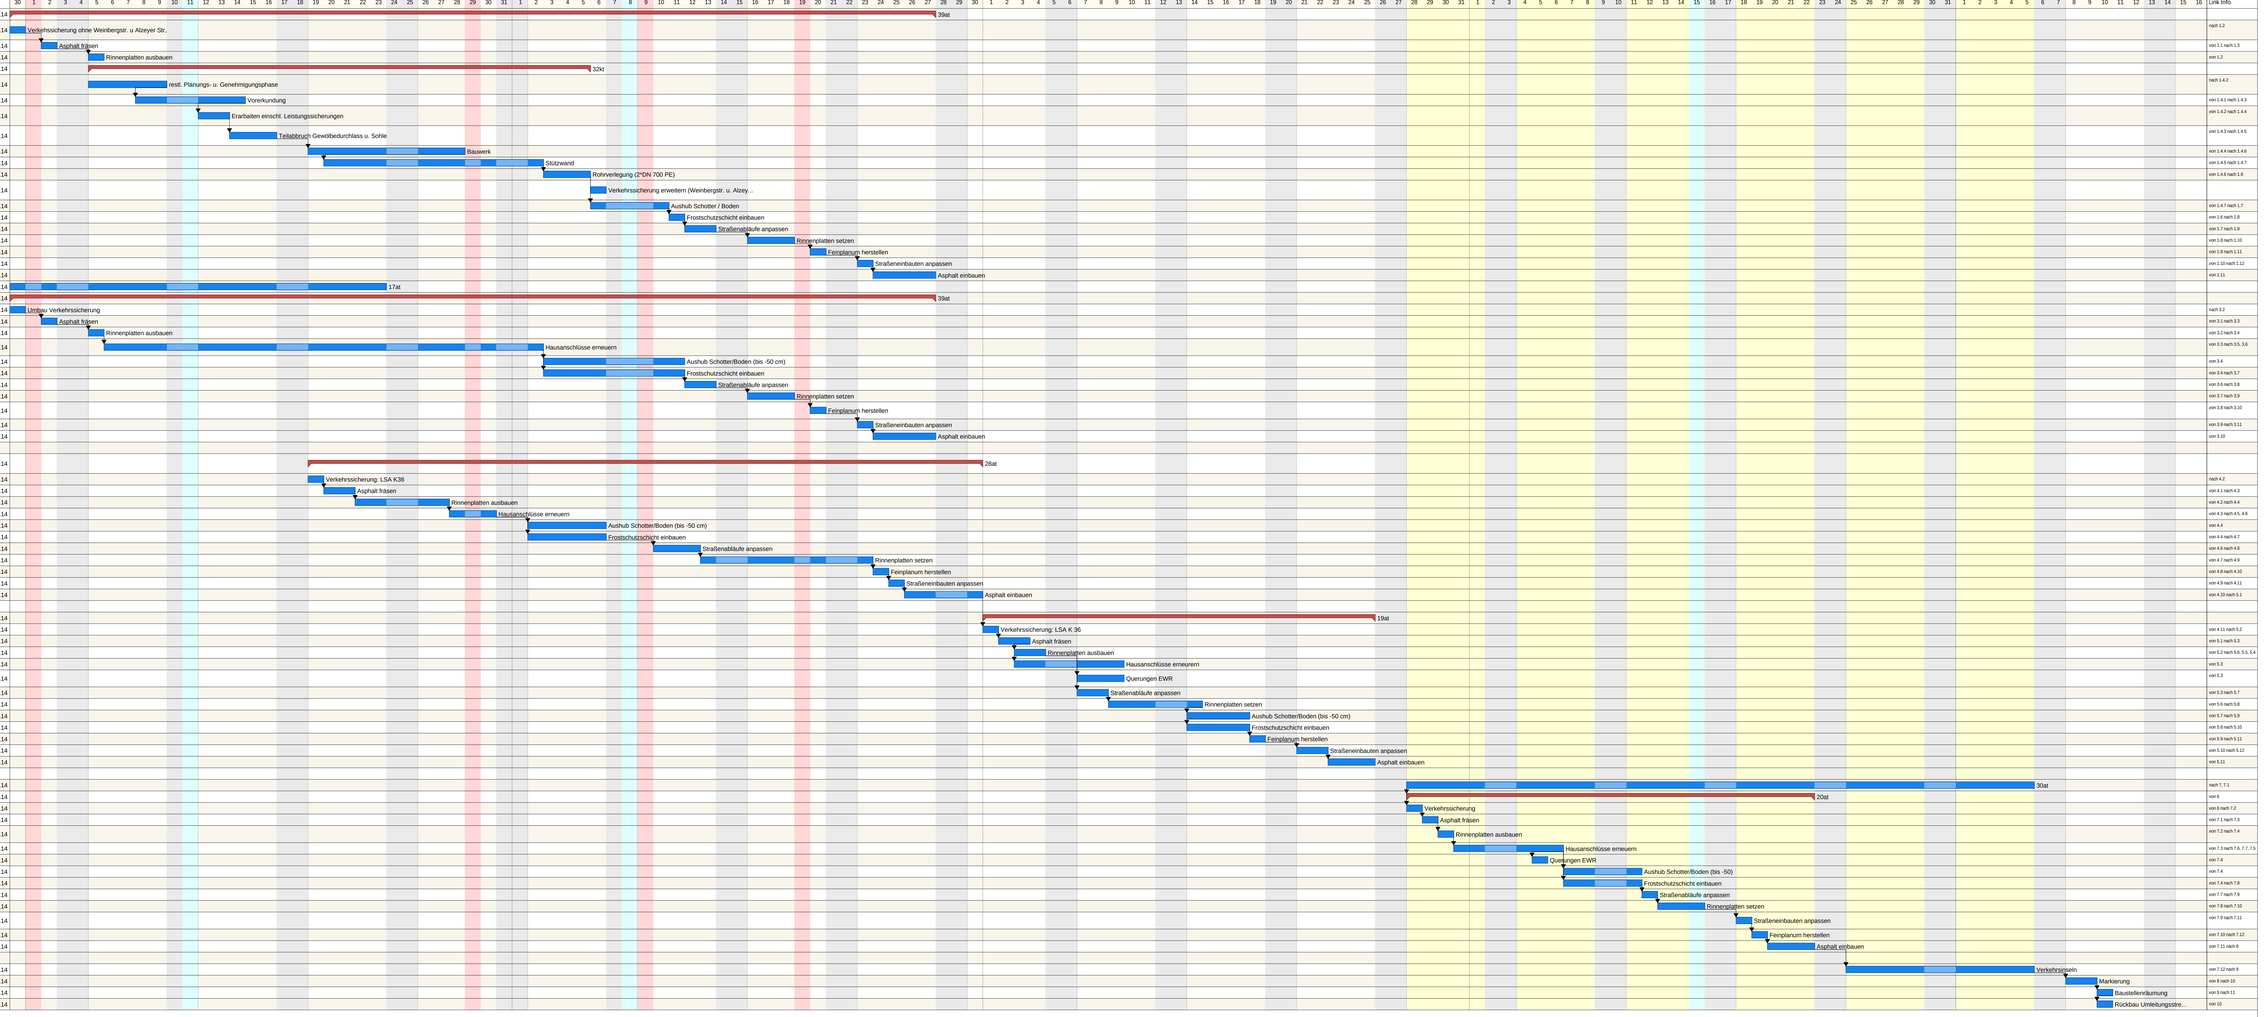

Faber Bau GmbH
Abteilung Bauwerksinstandsetzung
Galgenweiserweg 23-29
55232 Alzey
Tel. 06731/492-198
Fax 06731/492-136
e-Mail: alzey-bi@faber.eiffage.de

Version: 10.0 Build: 10.0.0.0 Typ: 1027 Lizenz für: Faber Bau GmbH, Alzey
